

**IZVJEŠĆE O RADU
REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE d.o.o.
ZA 2021. GODINU**

Slavonski Brod, ožujak 2022.



Materijal pripremljen u:
Regionalni centar za gospodarenje otpadom
Šagulje d.o.o.

KLASA: 400-05/22-01/01
URBROJ: 2178-01-33-22-01

Sadržaj

1	UVOD	3
2	OPIS PROJEKTA	6
2.1	Općenito o Projektu.....	6
2.2	Teritorijalni obuhvat projekta RCGO Šagulje.....	9
2.3	Opis projekta RCGO Šagulje	11
2.4	Etapnost i faznost gradnje	13
2.4.1	Etapa 1 – Trafostanica.....	13
2.4.2	Etapa 2 - Objekti, građevine i površine unutar RCGO koji se planiraju financirati u ovom programskom razdoblju	13
2.4.3	Etapa 3 – Kompostana	16
2.4.4	Etapa 4 - Sortirnica	17
2.4.5	Etapa 5 - Odlagalište za inertni otpad	17
2.5	Stupanj složenosti zahvata.....	19
2.6	Financiranje sredstvima iz fondova EU	19
2.7	Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju	19
3	PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI.....	20
3.1	Pregled aktivnosti vezanih uz izradu studijsko-projektne dokumentacije tijekom 2021. godine.....	20
3.1.1	Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 1:	20
3.1.2	Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 2:	21
3.1.3	Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 3:	23
3.2	Pregled aktivnosti promidžbe i vidljivosti Projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje	24
3.3	Ostale aktivnosti	25
4	OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI U 2021. GODINI.....	29
4.1	Stanje imovine	29
4.2	Financijski rezultati u 2021. godini.....	30
5	ZAKLJUČAK	31



1 UVOD

Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Sisačko-moslavačka županija su 08. studenog 2017. godine potpisale Društveni ugovor o osnivanju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o.

Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije, a sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. Slavonski Brod (u nastavku teksta: RCGO Šagulje d.o.o.) trgovačko je društvo u vlasništvu Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke županije (24,5%) osnovano s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradiški čime bi se završio postupak uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Republike Hrvatske.

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva primjenu različitih načina postupanja s otpadom koji se međusobno nadopunjuju radi sigurnog i djelotvornog uklanjanja otpada iz okoliša, uz najmanje štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš, uvažavajući općeprihvaćena načela zaštite okoliša, odnose uređene posebnim propisima, načela međunarodnog prava zaštite okoliša, znanstvene spoznaje i najbolje svjetske prakse.

Trgovačko društvo RCGO Šagulje d.o.o. je registrirano za obavljanje sljedeće djelatnosti:

- gospodarenje otpadom

Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupština Društva:

Brodsko-posavska županija (51%) – predstavnik dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., župan
Požeško-slavonska županija (24,5%) – predstavnica Antonija Jozić, univ.bacc.oec., županica
Sisačko-moslavačka županija (24,5%) – predstavnik Ivan Celjak, mag.iur., župan

Tijekom 2021. godine Skupština Društva održala je 2 sjednice s ukupno 13 točaka dnevnog reda, na kojima je, između ostaloga: usvojen Plan prihoda i rashoda Društva za 2022. godinu, dvije izmjene Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu, donesena Odluka o obliku sufinanciranja lokalne



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

komponente Projekta izgradnje RCGO Šagulje te su utvrđene Smjernice za rad i poslovanje u 2022. godini.

Nadzorni odbor:

- Olivera Maglić, dipl.ing.stroj. – predsjednica (Brodsko-posavska županija)
- Dalibor Tomljanović, dipl.ing. – zamjenik predsjednice (Požeško-slavonska županija)
- Željko Valešić, dipl.ing., član (Brodsko-posavska županija)
- Ivan Perić, član (Brodsko-posavska županija)
- Danijel Papa, član (Sisačko-moslavačka županija)

Nadzorni odbor je u 2021. godini održao 6 sjednica, s ukupno 29 točaka dnevnog reda na kojima je, sukladno nadležnosti i ovlastima utvrđenim Društvenim ugovorom, raspravljano, te su utvrđeni prijedlozi dokumenata koje usvaja Skupština Društva.

Uprava Društva:

Josip Grgić, dipl.ing.stroj., predsjednik Uprave (prosječna neto plaća predsjednika Uprave u 2021. godini iznosila je 11.719 kuna).

Društvo trenutno posluje u uredima Brodsko-posavske županije, za koje ne plaća najam, na adresi Trg Pobjede 26a, Slavonski Brod.

Temeljni kapital: 39.200,00 kuna.

Iskorištena EU financijska sredstva u 2021. godini:

EU plaće (projektni tim) i neizravni troškovi	527.850,00 kn
EU sredstva za izradu Studijsko-projektne dokumentacije	2.257.514,77 kn
Ukupno	2.785.364,77 kn

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu studijsko-projektne dokumentacije, između MZOE, FZOEU i RCGO ŠAGULJE d.o.o. u srpnju 2018. godine, odobreno je i sufinanciranje 3 bruto plaće članova projektnog tima u iznosu od 85.00 %, odnosno 459.000,00 kn za 2021. godinu, što predstavlja EU udio u sufinanciranju projekta.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Članovi projektnog tima su:

1. predsjednik Uprave (voditelj)
2. stručni suradnik za građevinske poslove (član)
3. samostalni suradnik za ekonomske i poslove javne nabave (član)



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

2 OPIS PROJEKTA

2.1 Općenito o Projektu

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje
Referentni broj Ugovora	KK.06.3.1.08.002
Ugovorena vrijednost	15.000.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta	17.07.2018. – 17.07.2022. (48 mjeseci)

Projekt je podijeljen je u tri grupe:

Grupa 1: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje za sufinanciranje sredstvima EU

Ugovor	01-VV-2019-01
Ugovorena vrijednost	4.790.000,00 HRK + PDV
Vrijeme trajanja projekta	15.10.2019 – 15.04.2022.
Izrađivač	Konzorcij - EKONERG d.o.o. ZAGREB, IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb, HIDROING d.o.o. Osijek, SL CONSULT d.o.o. Ljubljana

Grupa 1 obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije, čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije u sklopu prijave projekta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost 1/1: Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za RCGO Šagulje i pretovarne stanice
- Aktivnost 2/1: Idejno rješenje za RCGO Šagulje i prijedlog Idejnog rješenja tipske pretovarne stanice



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

- Aktivnost 3/1: Studija utjecaja na okoliš za RCGO Šagulje uključujući potrebne istražne radove (Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu)
- Aktivnost 4/1: Dokumentacija potrebna za ishodenje lokacijske dozvole za RCGO Šagulje (Idejni projekt, Geodetski projekt, Geotehnički-istražni radovi, posebni uvjeti javno-pravnih tijela i sva ostala dokumentacija)
- Aktivnost 5/1: Projektna prijava za projekt RCGO Šagulje u svrhu osiguranja EU sredstava (aplikacijski obrazac) sa svim potrebnim popratnim dokumentima

Grupa 2: Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju šest (6) Pretovarnih stanica na području obuhvata RCGO Šagulje

Ugovor	01-VV-2019-02
Ugovorena vrijednost	1.842.000,06 HRK + PDV
Vrijeme trajanja projekta	Uvođenje u posao 09.12.2020. godine Rok: 18 mjeseci od datuma uvođenja u posao
Izrađivač	Konzorcij – INSTITUT IGH d.d. ZAGREB, HIDROPLAN d.o.o. Zagreb, ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb

Grupa 2 obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Pretovarnih stanica u sklopu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za područje Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i dijela Sisačko-moslavačke županije potrebne za prijavu projekta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Aktivnost 1/2: Izrada Geodetskih projekata uključujući Parcelacijske elaborate (u skladu s potrebama) za izgradnju šest (6) Pretovarnih stanica
- Aktivnost 2/2: Elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice, uključujući radnje i postupke ovlaštenika do ishodenja upravnog akta (Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Utjecaj zahvata PS na ekološku mrežu)

- Aktivnost 3/2: Dokumentacija za ishođenje lokacijskih dozvola za šest (6) Pretovarnih stanica (Idejni projekt, preliminarni Geotehnički-istražni radovi, posebni uvjeti javno-pravnih tijela, i sva ostala dokumentacija)
- Aktivnost 4/2: Dokumentacija potrebna za ishođenje građevinskih dozvola za šest (6) Pretovarnih stanica (Glavni projekt, Geotehnički-istražni radovi, posebni uvjeti javno-pravnih tijela i sva ostala dokumentacija)
- Aktivnost 5/2: Izrada Izvedbenih projekata za izgradnju šest (6) Pretovarnih stanica

Grupa 3: Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za RCGO Šagulje i pretovarne stanice potrebne za sufinanciranje sredstvima EU

Ugovor	01-VV-2019-03
Ugovorena vrijednost	1.080.000,00 HRK + PDV
Vrijeme trajanja projekta	Uvođenje u posao 27.05.2021. Rok: 12 mjeseci od datuma uvođenja u posao
Izrađivač	Konzorcij – SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija, HIDROING d.o.o., Osijek

Grupa 3 obuhvaća izradu dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za RCGO Šagulje i šest Pretovarnih stanica potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za područje Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i dijela Sisačko-moslavačke županije u sklopu prijave projekta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:


- Aktivnost 1/3: Dokumentacija o nabavi projektiranja i izvođenja radova na izgradnji RCGO Šagulje
- Aktivnost 2/3: Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova RCGO Šagulje
- Aktivnost 3/3: Dokumentacija o nabavi opreme (uključujući vozila za prijevoz otpada od Pretovarnih stanica do RCGO Šagulje) za RCGO i PS
- Aktivnost 4/3: Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga rada s javnošću

- Aktivnost 5/3: Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga tehničke pomoći i/ili upravljanja projektom
- Aktivnost 6/3: Dokumentacija o nabavi za izvođenje radova na izgradnji Pretovarnih stanica
- Aktivnost 7/3: Dokumentacija o nabavi za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na Pretovarnim stanicama

2.2 Teritorijalni obuhvat projekta RCGO Šagulje

Obuhvat samog projekta prostire se na tri županije, i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku županiju.

Slika 1.: Obuhvat RCGO Šagulje

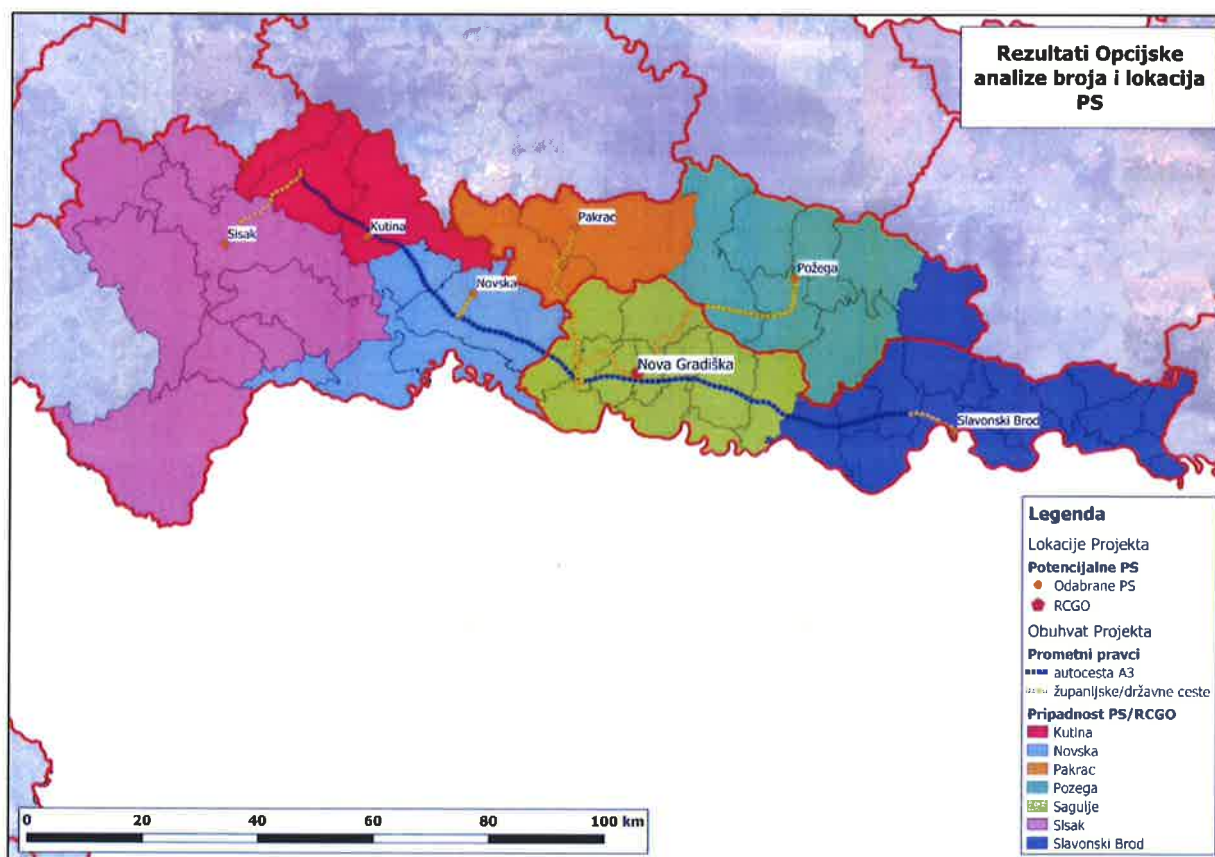

Sisačko-moslavačka županija sa sjedištem u Sisku ima 140.549 stanovnika. Središnju Hrvatsku određuje najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju osnovu čini



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

industrijalizirani trokut Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko manjih industrijskih sustava i pojedinih industrijskih središta. Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km² i zauzima cca 7,9% kopnenog teritorija RH(56.542 km²). Prema teritorijalnom ustroju na području Županije je 19 jedinica lokalne samouprave:

- 7 gradova: Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača;
- 12 općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Velika Ludina.

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planina Psunja, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga, koja je dio državne granice prema Bosni i Hercegovini u dužini od 163 km. Obuhvaća prostor od 2.034 km² što čini 3,61% ukupnog teritorija RH i ima 130.782 stanovnika. Jedna je od najužih (7 km) i najdužih županija (117 km). Prema teritorijalnom ustroju na području županije je 28 jedinica lokalne samouprave:

- 2 grada: Slavonski Brod i Nova Gradiška
- 26 općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijević, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogičevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibirnj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje, Vrpolje.

Požeško-slavonska županija ubraja se u red manjih županija u RH. Obuhvaća površinu od 1.815 m² i broji 64.420 stanovnika. Riječ je o županiji koja razbija uobičajenu predodžbu o ravnoj Slavoniji, budući da se ovdje na relativno malom prostoru, uz ravnice s plodnim njivama, nalaze i planine i gore čija podnožja, pak, krasi nadaleko poznati vinogradi, dok su viši dijelovi uglavnom pod šumom. Požeško-slavonska županija sastoji se od dvije prostorno odvojene cjeline - Požeške kotline te Pakračko-lipičkog kraja. Prema današnjem teritorijalnom ustroju na području županije je 10 jedinica lokalne samouprave:

- 5 gradova: Požega, Pleternica, Pakrac, Lipik i Kutjevo
- 5 općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, prema RCGO Šagulje gravitirat će 335.751 stanovnik.

2.3 Opis projekta RCGO Šagulje

Gospodarenje otpadom je jedno od najzahtjevnijih područja zaštite okoliša koje čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i njegovih štetnih utjecaja na okoliš, sakupljanje, prijevoz, uporabu i zbrinjavanje otpada, kao i nadzor nad tim djelatnostima.

Na predmetnom području, osnovu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom predstavljaju Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje i pretovarne stanice.

Pretovarne stanice su objekti unutar kojih se komunalni otpad, skupljen unutar skupljačkih mreža jedinica lokalne samouprave, prihvaća, priprema i prekrcava u vozila većeg kapaciteta, radi ekonomičnijeg prijevoza do RCGO Šagulje.

Utvrđeni regionalni koncept pretpostavlja izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) na lokaciji Šagulje kod Nove Gradiške i izgradnju 6 pretovarnih stanica za područje Brodsko-posavske (PS Slavonski Brod), Požeško-slavonske (PS Požega, PS Pakrac) te dio Sisačko-moslavačke županije (PS Kutina, PS Novska, PS Sisak).

Jedinice lokalne samouprave s područja obuhvata RCGO Šagulje svoje su planove gospodarenja otpadom, vezano uz gospodarenje miješanim i odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uskladili s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, kao i Zakonom o gospodarenju otpadom. S tim u vezi je predviđena izgradnja postrojenja za obradu komunalnog otpada u Novoj Gradiški gdje bi se obrađivao miješani komunalni otpad i ostali komunalni otpad, kao i odvojeno sakupljeni komunalni otpad s predmetnog područja.

Budući da je planirano postrojenje za veći dio JLS-ova udaljeno više od 30-tak kilometara, predviđen je prijevoz odvojeno sakupljenog otpada do postrojenja RCGO Šagulje vozilima većeg kapaciteta koristeći pretovarne stanice različitih kapaciteta.

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada.

RCGO Šagulje je predviđen za potrebe prihvata i obrade miješanog, glomaznog, građevinskog i ostalog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada, uključujući i biootpad, a koji će nastajati u projektiranom razdoblju od 25 godina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Za provedbu projekata izgradnje RCGO-a, planirana je prijava projekta za sufinanciranje sredstvima EU fondova.

Planirani kapaciteti radnih zona RCGO Šagulje uključuju:

- Odlagalište za neopasni otpad koje može zaprimiti sveukupno 1.200.000 m³ neopasnog otpada
- Odlagalište za inertni otpad ukupnog kapaciteta oko 560.000 m³ građevinskog i inertnog otpada
- Postrojenje za recikliranje građevnog otpada kapaciteta oko 7,9 t/h
- Postrojenje za mehaničku i biološku obradu miješanog komunalnog otpada, glomaznog otpada i ostatka iz materijalne uporabe otpada kapaciteta oko 45.000 t/god
- Kompostanu – postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kapaciteta oko 16.500 t/god
- Sortirnicu odvojeno sakupljenog otpada kapaciteta cca 40.000 t/god

Planirana lokacija za izgradnju RCGO Šagulje nalazi se na području Brodsko-posavske županije, u blizini grada Nova Gradiška. Građevina se nalazi jugozapadno od naselja Prvča u gradu Nova Gradiška, kako je prikazano slikom 2.

Slika 2.: Lokacija RCGO Šagulje



Ukupna površina planiranog zahvata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje je oko 52,88 ha.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

2.4 Etapnost i faznost gradnje

Predviđena je etapna, odnosno fazna izgradnja RCGO Šagulje, prema opisu u nastavku. Redoslijed izgradnje neće biti uvjetovan rednim brojem etape ili faze.

Za svaku fazu pojedinačno, ili za više faza grupirano, može se izraditi pojedinačni ili grupni Glavni projekt za koji će se izdati zasebna građevinska dozvola (za pojedinačnu fazu i/ili za više faza grupirano). Uporabne dozvole mogu se izdavati za svaku fazu pojedinačno.

2.4.1 Etapa 1 – Trafostanica

Etapom 1 predviđena je izgradnja trafostanice sa pripadajućom infrastrukturom. Površina etape 1 iznosi cca 0,22 ha. Nalazi se u središnjem južnom dijelu obuhvata zahvata RCGO Šagulje, odnosno neposredno uz ulazno-izlaznu zonu. Na lokaciji RCGO potrebno je izgraditi trafostanicu za potrebe elektroopskrbe. Trafostanica će biti zasebna samostojeća građevina na koju će se RCGO priključiti na srednjenaponsku distribucijsku mrežu HEP-a.

Predviđeni su sljedeći sadržaji:

- objekt trafostanice - zasebna samostojeća građevina
- pripadajuća infrastruktura
- makadamska pristupna površina
- zelene površine oko objekta trafostanice

2.4.2 Etapa 2 - Objekti, građevine i površine unutar RCGO koji se planiraju financirati u ovom programskom razdoblju

Faza 2-1 - Ulazno izlazna zona sa pratećom infrastrukturom i objektima, prometnice unutar RCGO sa infrastrukturom, uređenje zelenih površina i dr.

Faza 2-1A - Ulazno izlazna zona sa pratećom infrastrukturom i objektima (cca 0,06 ha).

Predviđeni su sljedeći sadržaji:

- porta-čuvarska kućica
- kolne vage s kućicom i nadstrešnicom
- uređaj za pranje podvozja
- prateća infrastruktura

Faza 2-1B – Glavne unutarnje prometnice RCGO-a sa infrastrukturom, zelene površine (uređenje okoliša), ograda, prateća infrastruktura, protupožarni pojas, ostale prometno-manipulativne površine, poljski put i dr. (cca 9,43 ha). Lokacija će biti ograđena ogradom. Uz ogradu će se izgraditi neasfaltirani protupožarni put uz kojega će se urediti vizualno dovoljno visok zaštitni zeleni pojas. Unutar RCGO će biti izgrađena glavna prometnica od koje će se izdvajati pristupi pojedinim zonama. Na istočnom djelu obuhvata RCGO-a unutar ograde predviđen je rezervirani prostor za buduće sadržaje (npr. odlagalište, prometna infrastruktura i sl.). Na zapadnom djelu obuhvata RCGO-a izvan ograde predmetnog zahvata predviđeno je uređenje makadamskog poljskog puta.

- glavne unutarnje prometnice RCGO-a s pripadajućom infrastrukturom
- uređenje djela kanala Hrvatskih voda
- ostale prometno-manipulativne površine i protupožarni put unutar RCGO-a
- ograda
- protupožarni pojas oko zahvata
- zelene površine (uređenje okoliša)
- uređenje djela kanala Hrvatskih voda
- uređenje makadamskog poljskog puta izvan ograde RCGO-a
- rezervirani prostor koridora za HŽ

Faza 2-2 – **Upravna zgrada sa parkiralištem i pratećom infrastrukturom** (cca 1,43 ha) nalazi se na jugoistočnom djelu zahvata RCGO uz ulazno-izlaznu zonu. U sklopu upravne zgrade predviđene su i pješačke površine, natkriveno parkiralište za zaposlene, parkiralište za posjetitelje te pripadajuća infrastruktura.

Faza 2-3 – **Transportni centar sa pratećom infrastrukturom** (cca 1,43 ha) nalazi se na središnjem južnom dijelu zahvata RCGO. Zgrada za servisiranje vozila je smještena je u krugu transportnog centra. Građevina je projektirana za servisiranje vozila, uključujući radionice, prostorije za radnike i laboratorij. Predviđena je izgradnja sljedećih sadržaja:

- garaže s radionicama i prostorom za radnike
- prometno-manipulativna površina
- autopraonica
- prostor za diesel crpku



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

- parkiralište za kamione i osobna vozila
- prateća infrastruktura

Faza 2-4 - **Natkriveno skladište I sa pratećom infrastrukturom** (cca 1,48 ha) nalazi se u središnjem južnom dijelu obuhvata zahvata RCGO, a služi za smještaj komunalne opreme, parkiranje strojeva i sl., te za skladištenje sortiranog otpada iz objekta sortirnice.

Faza 2-5 – **Postrojenje za mehaničku i biološku obradu otpada sa pratećom infrastrukturom** (cca 3,73 ha) nalazi se u centralnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Ovdje su planirani objekti za mehaničku i biološku obradu otpada, biofilter, ispirać plina, spremnik za tehnološke vode, istovarna zona i ostale manipulativne površine.

Faza 2-6 – **Prostor za obradu voda i odlagališnog plina** (cca 1,21 ha) nalazi se na središnjem sjevernom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Sastavni dio postrojenja za obradu procjednih voda je zatvoreni spremnik za prikupljanje procjednih i tehnoloških voda, zatvoreni spremnik za prihvatanje pročišćenih voda, uređaj za pročišćavanje otpadnih tehnoloških i procjednih voda i spremnik za mulj.

Faza 2-6A – Prostor za obradu voda – UPOV (cca 1,17 ha) predviđena je izgradnja sljedećih sadržaja:

- postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) sa pratećom infrastrukturom
- pripadajući spremnici
- bazen za sakupljanje procjednih voda iz odlagališta neopasnog otpada
- bazen za sakupljanje procjednih voda iz odlagališta inertnog otpada
- uređenje djela kanala Hrvatskih voda

Faza 2-6B – Prostor za obradu odlagališnog plina (cca 0,04 ha) predviđena je izgradnje sljedećih sadržaja:

- plato s uređajem za obradu odlagališnog plina
- prateća infrastruktura

Faza 2-7 – **Odlagalište za neopasni otpad** (cca 11,44 ha) nalazi se na zapadnom dijelu obuhvata zahvata RCGO i predviđena je izgradnja sljedećih sadržaja:

- odlagalište neopasnog otpada sastoji se od



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

- 7 kazeta N1-N7 za neopasni otpad
- Kazeta A na sjeverozapadnom dijelu odlagališta je predviđena za azbestni otpad
- prateća infrastruktura

Faza 2-8 – **Multifunkcionalni natkriveni prostor** (cca 1,96 ha) nalazi se u središnjem dijelu obuhvata zahvata RCGO zapadno od MBO postrojenja. Služi za privremeno skladištenje bala s SRF-om i/ili povremeno dozrijevanje stabilata. Predviđena je izgradnja sljedećih sadržaja:

- multifunkcionalni natkriveni prostor zaštićen s tri strane za privremeno skladištenje bala s SRF-om i/ili za privremeno dozrijevanje stabilata
- prometno-manipulativna površina
- prateća infrastruktura

Faza 2-9 – **Prostor za recikliranje i obradu građevnog i inertnog otpada** (cca 2,14 ha) nalazi se u sjeverozapadnom dijelu obuhvata zahvata RCGO, južno od odlagališta inertnog otpada. Unutar površine predviđene za smještaj prostora za obradu građevnog otpada nalazit će se plato za manipulaciju vozilima, prostor za smještaj građevnog otpada, zelena površina, taložnik i separator ulja/masti, sabirni bazen za oborinske vode i objekt za zaposlene. Objekt za smještaj zaposlenika i opreme biti će kontejnerske izvedbe.

Faza 2-10 – **Natkriveno skladište II sa pratećom infrastrukturom** (cca 1,03 ha) nalazi se u središnjem dijelu obuhvata zahvata RCGO istočno od MBO postrojenja. Služi za demontažu/obradu glomaznog otpada. Predviđena je izgradnja sljedećih sadržaja:

- natkriveno skladište II za demontažu/obradu glomaznog otpada zaštićeno s tri strane
- prometno-manipulativna površina
- prateća infrastruktura

2.4.3 Etapa 3 – Kompostana

Etapom 3 predviđena je izgradnja kompostane sa prilaznom prometnicom i pripadajućom infrastrukturom. Nalazi se u središnjem sjevernom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Na njoj je planiran objekt za biološku obradu otpada, biofilter, ispirać plina, spremnik za tehnološke vode, manipulativne površine. Površina etape 3 iznosi cca 2,55 ha.

2.4.4 Etapa 4 - Sortirnica


Etapom 4 predviđena je izgradnja sortirnice sa pripadajućom infrastrukturom. Nalazi se u središnjem južnom dijelu obuhvata zahvata RCGO. Građevina je projektirana za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada. Površina etape 4 iznosi cca 2,23 ha.

2.4.5 Etapa 5 - Odlagalište za inertni otpad

Etapom 5 predviđena je izgradnja odlagališta za inertni otpad (cca 6,15 ha) sa slijedećim sadržajem:

- odlagalište inertnog otpada
 - Kazete I-1, I-2, I-3, I-4 i I-5
- prateća infrastruktura

Slika 3.: Etapnost i faznost izgradnje RCGO Šagulje

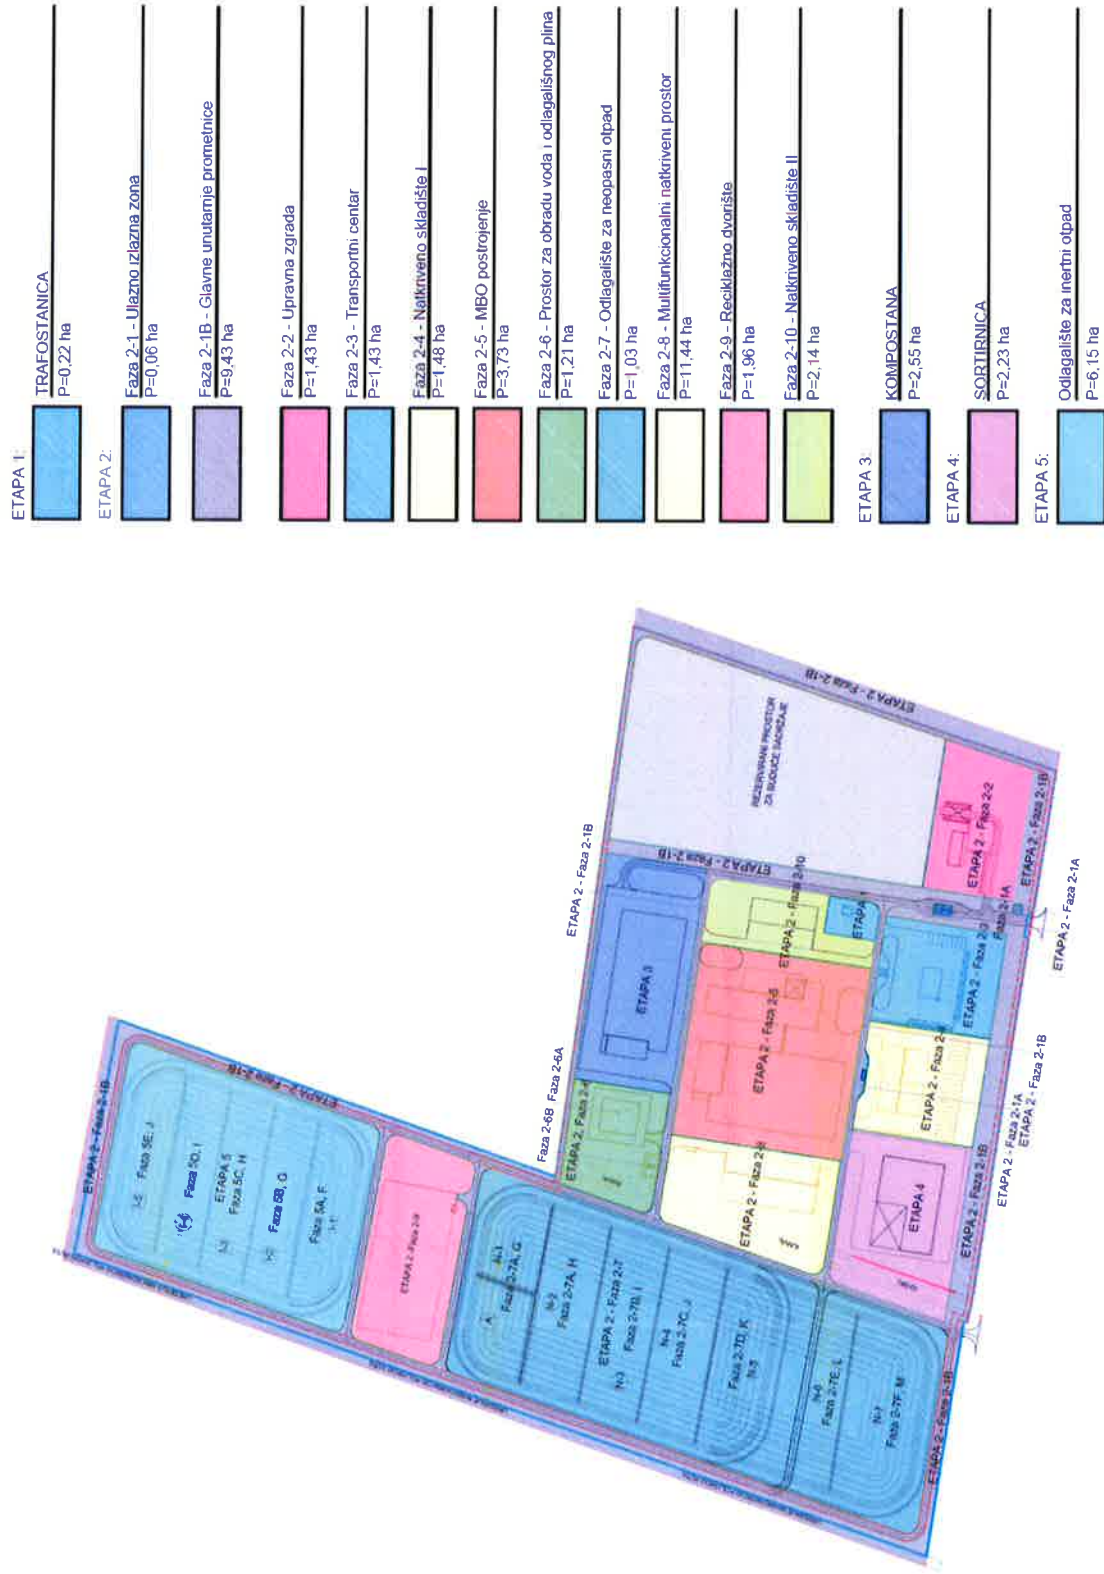

2.5 Stupanj složenosti zahvata

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u okolici grada Nova Gradiška, prema zahtjevnosti postupka u vezi s gradnjom se razvrstava u 2a. skupinu – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), gospodarenje otpadom i građenje građevina za gospodarenje otpadom od interesa su za Republiku Hrvatsku, a Centar za gospodarenje otpadom i obrada opasnog otpada postupkom spaljivanja i odlaganja od posebnoga su interesa za RH. Financijska sredstva za uspostavu građevina za gospodarenje otpadom osiguravaju se putem Fonda za zaštitu okoliša i iz drugih izvora.

2.6 Financiranje sredstvima iz fondova EU

Gradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje sufinancirat će se iz nacionalnog i fondova EU, a uvjeti i način financiranja iz fondova EU bit će definirani kroz Operativni program.

2.7 Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju

Članak 30. Prostornog plana uređenja Brodsko-posavske županije utvrđuje:

... slijedeće građevine gospodarenja otpadom kao građevine od važnosti za Državu: CGO odnosno regionalni centar gospodarenja otpadom RCGO Šagulje koji obuhvaća pripadajući dio Brodsko-posavske županije, dio Požeško-slavonske županije i dio Sisačko-moslavačke županije i s predviđenim gravitirajućim obuhvatom za cca. 273.441 stanovnika. U sustav RCGO ulazi 6 pretovarnih stanica od kojih je jedna predviđena u gradu Slavonskom Brodu, a ostale su izvan područja Brodsko-posavske županije. ...

Člankom 9. Prostornog plana uređenja Grada Nove Gradiške utvrđene su građevine od važnosti za Državu i Županiju:

A Građevine od važnosti za Državu na području Grada Nova Gradiška jesu:



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

...

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Nova Gradiška.

...

Sektor lokacijskih dozvola i investicija Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdao je 04. veljače 2021.

Potvrdu o usklađenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02/21-02/1; URBROJ: 531-06-2-1-1-24-4).

3 PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

3.1 Pregled aktivnosti vezanih uz izradu studijsko-projektne dokumentacije tijekom 2021. godine

3.1.1 Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 1:

Dokumentacija Studije izvedivosti korigirana je sukladno komentarima JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) GN1 od 29. siječnja 2021., sukladno uputama Naručitelja dostavljenih kroz zapisnike sa sastanaka održanih 25. ožujka i 6. travnja 2021. te komentarima JASPERS-a GN2 od 21. srpnja 2021. Završena je, i predana u srpnju 2021.

Do 15. listopada 2021. godine predano je, i prihvaćeno Idejno rješenje za RCGO te idejna rješenja za pretovarne stanice.

U srpnju 2021. predan je Idejni projekt.

Studija utjecaja zahvata na okoliš završena je, i predana do lipnja 2021. godine te je 16. srpnja 2021. održana prva Konferencija Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš RCGO Šagulje.

Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije održao se u razdoblju od 19. studenog do 20. prosinca 2021.

Javna rasprava i javno izlaganje sa nazočnim predstavnicima nositelja zahvata i ovlaštenika, održano je dana 7. prosinca 2021. god. u 11,00 sati u prostorijama Grada Nova Gradiška.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

28. prosinca 2021. dostavljeno je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i javnom uvidu. Na izrađenu Studiju utjecaja na okoliš RCGO Šagulje nije bilo komentara niti primjedbi te se očekuje 2. sjednica Povjerenstva i završetak izrade dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole za RCGO.

Tablica 1.: Vrijednost izvedenih radova – Grupa 1:

	UKUPNO (kn)	PDV (kn)	SVEUKUPNO (kn)
Vrijednost ugovorenih radova	4.790.000,00	580.000,00	5.370.000,00
Ukupna vrijednost izvedenih radova zaključno sa 12/2021	2.592.000,00	401.000,00	2.993.000,00

Tablica 2.: Pregled financiranja Grupe 1:

Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2021.	2.592.000,00
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	2.203.200,00
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	129.600,00
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	259.200,00

3.1.2 Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 2:

Dana 09.12.2020. godine izrađivači dokumentacije za Grupu 2 predmeta nabave su uvedeni u posao, sukladno Ugovoru.

Dana 10.03.2021. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za pripremu terena za obavljanje geodetskih usluga na lokacijama pretovarnih stanica. Priprema terena sastojala se od sljedećih radnji: uklanjanje šiblja i raslinja; malčiranje; tarupiranje i uklanjanje stabala.

Priprema terena odrađena je 30. ožujka 2021. te je dostavljeno Izvješće o odrađenim radovima koje je i prihvaćeno.

Geodetski projekti izrađeni su i predani za pretovarne stanice: Kutina, Pakrac, Požega, Novska i Slavonski Brod.

Elaborati zaštite okoliša izrađeni su i predani na postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za pretovarne stanice: Kutina (predan 27.07.2021.), Pakrac (predan 10.09.2021.), Požega (predan 08.09.2021.), Novska (predan 08.09.2021.) i Slavonski Brod (predan 08.11.2021.). Izrađen je, i prihvaćen koncept idejnog rješenja za pretovarne stanice: Kutina, Pakrac, Požega, Novska i Slavonski Brod.

Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu predana je, i prihvaćena za pretovarne stanice: Novska, Pakrac i Požega.

S gradom Slavonskim Brodom održana su dva sastanka.

Prvi sastanak je održan 28. lipnja 2021. gdje je tema bila analiza pretovarne stanice Slavonski Brod s naglaskom na lokaciju i pristupnu cestu. Na sastanku su predstavnici grada Slavonskog Broda bili prisutni pročelnik upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Damir Klaić i voditeljica pododsjeka za zaštitu okoliša grada Slavonskog Broda Irena Matković, predstavnici RCGO-a Šagulje Josip Grgić i Igor Daidžić i ispred izrađivača dokumentacije glavna projektantica projekta Dragica Pašović. Bitne točke sastanka su:

- Na sastanku je Grad pobliže upoznat s projektom Centra.
- Dogovorena je lokacija unutar odlagališta s pristupnom cestom sa sjeverne strane.
- Grad je tražio uređenje imovinsko-pravnih odnosa prije bilo kakvih daljnjih radova na projektu. Dogovoreno je da RCGO Šagulje dostave prijedlog traženog uređenja odnosa.
- Dogovoreno je da će se neriješena pitanja na koja Grad u tom trenutku nije imao odgovor dostaviti naknadno.

Nakon što je dostavljen prijedlog uređenja imovinsko-pravnih odnosa 23. srpnja 2021. (Ugovor o osnivanju prava građenja), Grad je odgovorio da se imovinsko-pravni odnosi mogu urediti tek po lokacijskoj dozvoli te da će oni napraviti prijedlog.

Nakon izrađenog prijedloga idejnog rješenja zatražen je novi sastanak s Gradom koji se održao 16. rujna 2021. na kojem su sudjelovali pročelnik upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Damir Klaić ispred grada Slavonskog Broda i Josip Grgić i Igor Daidžić ispred RCGO-a Šagulje. Bitne točke sastanka su:

- idejno rješenje je, u principu, prihvatljivo za obje strane.
- u postupku lokacijske dozvole tražit ćemo od Grada suglasnost na idejno rješenje.



- u skladu s lokacijskom dozvolom će se izvršiti parcelacija na način da će se formirati 2 dodatne čestice. Jedna za pretovarnu stanicu, druga za pristupnu cestu.
- pristupnu cestu će koristiti obje strane, djelatnici komunalne tvrtke i djelatnici RCGO Šagulje.
- nakon formiranja novih čestica će se pristupiti uređivanju odnosa između Grada i RCGO Šagulje (npr. putem Ugovora o pravu gradnje).

Tijekom cijele 2020. i 2021. godine bezuspješno smo pokušavali dogovoriti sastanak s Gradom Siskom, vezan uz odabir lokacije pretovarne stanice na području Grada Siska.

Dana 08. travnja 2021. godine na tu je temu održan sastanak u Uredu Predsjednika RH, a 22. prosinca održan je sastanak s predstavnicima Grada Siska. Nakon sastanka potvrđena je planirana lokacija pretovarne stanice Sisak, na području oko Goričice te je ista uvrštena u IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.

Tablica 3.: Vrijednost izvedenih radova – Grupa 2:

	UKUPNO (kn)	PDV (kn)	SVEUKUPNO (kn)
Vrijednost ugovorenih radova	1.842.000,06	460.500,01	2.302.500,07
Ukupna vrijednost izvedenih radova zaključno sa 12/2021	190.299,73	22.995,35	213.295,08

Tablica 4.: Pregled financiranja Grupe 2:

Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2021.	213.295,08
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	181.300,82
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	10.664,75
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	21.329,51

3.1.3 Izvršene aktivnosti i predana dokumentacija Naručitelju za Grupu 3:

Grupa 3 uvedena je u posao dana 27.05.2021. godine.

Do 31.12.2021. izrađena je i predana radna verzija Dokumentacije o nabavi za pružanje usluga nadzora nad projektiranjem i izgradnjom RCGO Šagulje te radna verzija Dokumentacije o nabavi



za usluge nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica u obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje.

Dokumentacija je pregledana te, uz korekcije, odobrena.

3.2 Pregled aktivnosti promidžbe i vidljivosti Projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje

Postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga informiranja, komunikacije, promidžbe i vidljivosti projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ pokrenut je u travnju 2021. godine.

Ugovor o obavljanju navedenih usluga sklopljen je dana 02. kolovoza 2021. godine s tvrtkom Ekonerg d.o.o., a na iznos od 174.900,00 kn bez PDV-a.

Ova aktivnost također je financirana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, u iznosu od 85%, ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje davanjem kapitalne pomoći, u iznosu od 5% te Ugovorom o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, u preostalom iznosu.

Na temelju sklopljenog Ugovora, izvršitelji su uvedeni u posao dana 25. kolovoza 2021. godine.

U skladu s Ugovorom i Projektnim zadatkom te planiranim aktivnostima iz Terminskog/Dinamičkog plana provedene su slijedeće aktivnosti:

Osmišljavanje, grafički dizajn, priprema za tisak i dostava promotivnih materijala:

- Plakat
- Info brošura
- Rolo baner
- USB memorija
- Reklamni eko mini notes s kemijskom olovkom i memo listovima

Medijska promidžba

- Izrada i oblikovanje materijala za objavu na web stranici projekta i društvenim mrežama te kontinuirano ažuriranje objavljenih informacija
- Zakup prostora na društvenim mrežama i Google platformama
- Dizajn, izrada i formatiranje web banera



Tablica 5.: Vrijednost izvršenih aktivnosti – Promidžba i vidljivost

	UKUPNO (kn)	PDV (kn)	SVEUKUPNO (kn)
Vrijednost ugovorenih radova	174.900,00	43.725,00	218.625,00
Ukupna vrijednost izvedenih radova zaključno sa 12/2021	28.600,00	7.150,00	35.750,00

Tablica 6.: Pregled financiranja promidžbe i vidljivosti:

Vrijednost izvršenih usluga do 31.12.2021.	35.750,00
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 85% (MINGOR)	30.387,50
Ugovor o sufinanciranju u iznosu 5% (FZOEU)	1.787,50
Ugovor o sufinanciranju (MRRFEU)	3.575,00

3.3 Ostale aktivnosti

Tijekom 2021. godine podneseno je pet zahtjeva za nadoknadom sredstava Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i tri zahtjeva za nadoknadom sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U nastavku se daje financijski pregled svih podnesenih zahtjeva.

Tijekom izvještajnog razdoblja, Projektni tim RCGO Šagulje sudjelovao je u radu Grupacije Centara za gospodarenje otpadom kroz davanje komentara na prijedloge izmjena zakonske regulative.

Projektni tim također je surađivao s jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu RCGO Šagulje prilikom izrade izmjena Prostornih planova istih.

Tablica 7.: Financijski pregled projekta temeljem svih odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava

Financijski pregled projekta

Operativni Financijski odobrenje	Datum dobivenog odobrenja	Datum registri- ranosti	Dobitnost prijavljive investicije (tisuća HRK)	Odobreni iznos BK (tisuća HRK)	Prinosimo odobrenji prihvatljivi (tisuća HRK)	Zbrana svih usvaja- nkama (tisuća HRK)	Iznos za sigurni otpad (tisuća HRK)	Iznos za pripremu otpada (tisuća HRK)	Iznos za pripremu otpada (tisuća HRK)	Iznos za pripremu otpada (tisuća HRK)
ZNS-01	ZNS-01 PTR - odobrenje	30.10.2018.	138.000,00	117.300,00						
ZPL-01	ZNS-01 PTR - odobrenje	31.10.2018.					117.300,00			117.300,00
ZNS-02	ZNS-02 PTR - odobrenje	14.12.2018.	63.687,33	54.134,23			54.134,23			54.134,23
ZPL-02	ZNS-02 PTR - odobrenje	14.12.2018.								
ZNS-03	ZNS-03 PTR - odobrenje	21.02.2019.	49.408,48	41.997,20			41.997,20			41.997,20
ZPL-03	ZNS-03 PTR - odobrenje	21.02.2019.								
ZNS-04	ZNS-04 PTR - odobrenje	27.03.2019.	98.816,95	83.994,42			83.994,42			83.994,42
ZPL-04	ZNS-04 PTR - odobrenje	27.03.2019.								
ZNS-05	ZNS-05 PTR - odobrenje	08.07.2019.	147.648,25	125.501,87			125.501,87			125.501,87
ZPL-05	ZNS-05 PTR - odobrenje	08.07.2019.								
ZNS-06	ZNS-06 PTR - odobrenje	27.09.2019.	196.865,68	167.335,83			167.335,83			167.335,83
ZPL-06	ZNS-06 PTR - odobrenje	27.09.2019.								
ZNS-07	ZNS-07 PTR - odobrenje	27.09.2019.	147.848,25	125.501,87			125.501,87			125.501,87
ZPL-07	ZNS-07 PTR - odobrenje	02.01.2020.								
ZNS-08	ZNS-08 PTR - odobrenje	02.01.2020.	315.250,00	267.962,50			267.962,50			267.962,50
ZPL-08	ZNS-08 PTR - odobrenje	10.04.2020.								
ZNS-09	ZNS-09 PTR - odobrenje	10.04.2020.	155.250,00	131.962,50			131.962,50			131.962,50
ZPL-09	ZNS-09 PTR - odobrenje	10.07.2020.								
ZNS-10	ZNS-10 PTR - odobrenje	10.07.2020.	103.500,00	87.975,00			87.975,00			87.975,00
ZPL-10	ZNS-10 PTR - odobrenje	26.08.2020.								
ZNS-11	ZNS-11 PTR - odobrenje	27.11.2020.	155.250,00	131.962,50			131.962,50			131.962,50
ZPL-11	ZNS-11 PTR - odobrenje	27.11.2020.								
ZNS-12	ZNS-12 PTR - odobrenje; ZNS-12 NPT - privremeno odobrenje	17.12.2020.	517.500,00	43.987,50	1.284.000,00	1.061.400,00				1.135.387,50
ZPL-12	ZNS-12 NPT - privremeno odobrenje; ZNS-12 PTR - odobrenje	17.12.2020.								
ZNS-12	ZNS-12 NPT - konačno odobrenje	01.03.2021.			-1.284.000,00	-1.091.400,00				
ZNS-13	ZNS-13 PTR - odobrenje	01.03.2021.	103.500,00	87.975,00			87.975,00			87.975,00
ZPL-13	ZNS-13 PTR - odobrenje	02.03.2021.								

Tablica 8.: Pregled svih podnesenih zahijeva za nadoknadom sredstava

Pregled zahijeva za nadoknadom sredstava

Oznaka	Vrsta zahijeva	Inačica	Potraživani plaćeni troškovi (HRK)	Potraživani neplaćeni troškovi (HRK)	Ukupni potraživani troškovi (HRK)	Ukupni odobreni troškovi (HRK)	Pečatak izvještajnog razdoblja	Završetak izvještajnog razdoblja	Status
ZNS-01	Medu-zahijev	3	138.000,00 kn	0,00 kn	138.000,00 kn	138.000,00 kn	20.07.2018.	31.08.2018.	Odobren
ZNS-02	Medu-zahijev	3	63.687,33 kn	0,00 kn	63.687,33 kn	63.687,33 kn	20.07.2018.	15.11.2018.	Odobren
ZNS-03	Medu-zahijev	1	49.408,48 kn	0,00 kn	49.408,48 kn	49.408,48 kn	20.07.2018.	31.12.2018.	Odobren
ZNS-04	Medu-zahijev	2	98.816,96 kn	0,00 kn	98.816,96 kn	98.816,96 kn	20.07.2018.	28.02.2019.	Odobren
ZNS-05	Medu-zahijev	2	147.649,26 kn	0,00 kn	147.649,26 kn	147.649,26 kn	20.07.2018.	31.05.2019.	Odobren
ZNS-06	Medu-zahijev	3	196.865,68 kn	0,00 kn	196.865,68 kn	196.865,68 kn	20.07.2018.	10.09.2019.	Odobren
ZNS-07	Medu-zahijev	2	147.649,26 kn	0,00 kn	147.649,26 kn	147.649,26 kn	20.07.2018.	11.12.2019.	Odobren
ZNS-08	Medu-zahijev	2	315.250,00 kn	0,00 kn	315.250,00 kn	315.250,00 kn	20.07.2018.	10.03.2020.	Odobren
ZNS-09	Medu-zahijev	1	155.250,00 kn	0,00 kn	155.250,00 kn	155.250,00 kn	20.07.2018.	04.06.2020.	Odobren
ZNS-10	Medu-zahijev	1	103.500,00 kn	0,00 kn	103.500,00 kn	103.500,00 kn	20.07.2018.	12.08.2020.	Odobren
ZNS-11	Medu-zahijev	1	155.250,00 kn	0,00 kn	155.250,00 kn	155.250,00 kn	20.07.2018.	05.11.2020.	Odobren
ZNS-12	Medu-zahijev	2	51.750,00 kn	1.284.000,00 kn	1.335.750,00 kn	1.335.750,00 kn	20.07.2018.	30.11.2020.	Odobren
ZNS-13	Medu-zahijev	1	103.500,00 kn	0,00 kn	103.500,00 kn	103.500,00 kn	20.07.2018.	02.02.2021.	Odobren
ZNS-14	Medu-zahijev	1	155.250,00 kn	0,00 kn	155.250,00 kn	155.250,00 kn	20.07.2018.	03.05.2021.	Odobren
ZNS-15	Medu-zahijev	2	999.500,00 kn	896.000,00 kn	999.500,00 kn	999.500,00 kn	20.07.2018.	08.07.2021.	Odobren
ZNS-16	Medu-zahijev	2	103.500,00 kn	252.000,00 kn	355.500,00 kn	355.500,00 kn	20.07.2018.	21.09.2021.	Odobren
ZNS-17	Medu-zahijev	2	51.750,00 kn	218.899,73 kn	270.649,73 kn	270.649,73 kn	20.07.2018.	22.10.2021.	Odobren (tražen dokaz plaćanja)

Tablica 9.: Pregled zahijeva za nadoknadom sredstava predanih u 2021. godini

ZNS-13	Medu-zahijev	1	103.500,00 kn	0,00 kn	103.500,00 kn	103.500,00 kn	20.07.2018.	02.02.2021.	Odobren
ZNS-14	Medu-zahijev	1	155.250,00 kn	0,00 kn	155.250,00 kn	155.250,00 kn	20.07.2018.	03.05.2021.	Odobren
ZNS-15	Medu-zahijev	2	103.500,00 kn	896.000,00 kn	999.500,00 kn	999.500,00 kn	20.07.2018.	08.07.2021.	Odobren
ZNS-16	Medu-zahijev	2	103.500,00 kn	252.000,00 kn	355.500,00 kn	355.500,00 kn	20.07.2018.	21.09.2021.	Odobren
ZNS-17	Medu-zahijev	2	51.750,00 kn	218.899,73 kn	270.649,73 kn	270.649,73 kn	20.07.2018.	22.10.2021.	Odobren (tražen dokaz plaćanja)



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz
OP Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

4 OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI U 2021. GODINI

4.1 Stanje imovine

Ukupna vrijednost aktive u 2021. godini iznosila je 6.497.401 kunu, od čega je 4.614.276 kn vrijednost materijalne imovine, a 1.883.125 kn potraživanja i novac.

U nastavku u tablici se daje pregled bilance za 2021. godinu u usporedbi sa 2020. godinom.

Tablica 10: Bilanca na dan 31.12.2021.

(svi iznosi izraženi su u kunama)

STAVKA	BILJEŠKA	2020	2021
IMOVINA			
Dugotrajna imovina		2.579.336	4.614.276
Materijalna imovina		2.579.336	4.614.276
Kratkotrajna imovina		1.727.179	1.883.125
Potraživanja od države i drugih institucija		237.282	17.415
Ostala potraživanja		1.694	1.694
Novac u banci i blagajni		1.488.203	1.864.016
UKUPNO AKTIVA		4.324.515	6.497.401
<hr/>			
KAPITAL I REZERVE			
Upisani kapital		39.200	39.200
Zadržana dobit		13.651	14.080
Dobit / (gubitak) poslovne godine		429	518
Ukupno kapital		53.280	53.799
Kratkoročne obveze			
Obveze prema dobavljačima		1.567.171	12.416
Obveze prema zaposlenicima		36.404	35.789
Ostale kratkoročne obveze		82.480	82.480
Ukupne kratkoročne obveze		2.288.699	483.908
Odgođeni prihodi		1.982.536	5.959.694
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE		4.324.515	6.497.401



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

4.2 Financijski rezultati u 2021. godini

Tablica 11: Ostvareni financijski rezultati u 2021. godini s ocjenom poslovanja u odnosu na 2020. godinu

RB	Pozicija	2020	2021	Indeks
1	2	3	4	5(4/3x100)
1	Poslovni prihodi	960.100	1.025.829	106,84
2	Poslovni rashodi	973.844	1.044.111	107,22
3	Financijski prihodi	15.755	20.322	128,99
4	Financijski rashodi	1	2	200,00
5	Ukupni prihodi (1+3)	975.855	1.046.151	107,20
6	Ukupni rashodi (2+4)	973.845	1.044.113	107,22
7	Dobit prije oporezivanja (5-6)	2.010	2.038	101,39
8	Porez na dobit	1.581	1.520	96,14
9	Neto dobit tekuće godine (7-8)	429	518	120,75

U 2021. godini subvencije od osnivača za iznosile su ukupno 1.501.162,99 kn, od čega:

- Brodsko-posavska županija = 765.593,13 kn
- Požeško-slavonska županija = 367.783,93 kn
- Sisačko-moslavačka županija = 367.783,93 kn

5 ZAKLJUČAK

Trgovačko društvo RCGO Šagulje d.o.o. je u svemu i u cijelosti redovito poštivalo sve upute resornih ministarstava i sukladno zakonskim obvezama poduzimalo sve radnje i aktivnosti u pravcu ostvarivanja cilja radi kojeg je i osnovano – uspostava sustava gospodarenja otpadom i izgradnja Centra u Šaguljama.

Slijedom iznesenih pokazatelja, možemo zaključiti da je RCGO Šagulje d.o.o. nastavilo s provođenjem efikasnijeg upravljanja poslovnim procesima koji su izrazito zahtjevni kod navedenog projekta.

Iako je 2021. godina bila izuzetno izazovna, ponajprije zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19, a i potresom razrušenih jedinica lokalne samouprave u obuhvatu Centra, projektni tim je bez zastoja obavljao sve povjerene zadatke.

Za izradu cjelokupne studijsko-projektne dokumentacije povučena su bespovratna sredstva te Osnivači Društva nemaju troškova za istu.

U 2021. godini rezultat poslovanja je 518,00 kn, ali je iz prikazanih podataka razvidno da je i dalje stabilno poslovanje društva, uz svu navedenu problematiku.

Predsjednik Uprave

Josip Grgić, dipl.ing.stroj.



REGIONALNI
GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE
D.O.O.
TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**
